

ภาพรวม: ควบคุมโครงการตั้งแต่ทำสัญญา จนส่งมอบงานและคืนหลักประกัน

ทำเอกสารอะไร · ทำ/ยื่นเมื่อไร · ยื่นใคร · ได้อะไรกลับ · ตรวจสอบลายเซ็น-ตราอย่างไร · สแกนเก็บที่ไหน

1

2

3

4

5

6

7

PHASE

ได้รับหนังสือแจ้งผล / เชิญทำสัญญา / ใบสั่งจ้าง

จุดเริ่มต้นของ PE

1

ทำสัญญา (Contract)

หน้า 2

เมื่อไร: กันที่กันได้หนังสือเชิญ → ก่อนวันนัดลงนาม

ร่างสัญญา หลักประกันสัญญา (LG) หนังสือรับรองบริษัท
หนังสือมอบอำนาจ อักษรแสตมป์

✓ ผ่านด้านเมื่อ: สัญญาลงนามครบ 2 ฝ่าย + สแกนแล้ว + ทำสรุปสัญญา 1 หน้า

2

เตรียมเริ่มงาน (Mobilization)

หน้า 3

เมื่อไร: หลังลงนามสัญญา → ก่อนเข้าพื้นที่ (ตามกำหนดวันในสัญญา)

แผนงาน / S-Curve ผังองค์กร + ใบ กว. ประกันภัย CAR
แผนความปลอดภัย หนังสือให้เริ่มงาน บันทึกส่งมอบพื้นที่

✓ ผ่านด้านเมื่อ: ได้หนังสือให้เริ่มงาน + รับมอบพื้นที่เป็นลายลักษณ์อักษร

3

ขออนุมัติก่อนทำ (Submittal)

หน้า 4

เมื่อไร: ก่อนส่งของ/ก่อนเริ่มงานแต่ละส่วน ส่องหน้า 2-4 สัปดาห์ (ทำซ้ำตลอดโครงการ)

Shop Drawing Material Approval Method Statement RFI
Transmittal

✓ ผ่านด้านเมื่อ: ได้สถานะ A หรือ B เท่านั้น จึงใช้หน้างาน/ส่งข้อได้

4

ควบคุมงานก่อสร้าง (Construction)

หน้า 5

เมื่อไร: ทุกวัน / ทุกสัปดาห์ / ทุกเดือน + เมื่อมีเหตุการณ์

Daily Report ใบขอตรวจงาน ผลทดสอบวัสดุ
รายงานการประชุม (MOM) Monthly Report งานเพิ่ม-ลด / ขยายเวลา

✓ ผ่านด้านเมื่อ: เนื่องจากครบตามงวด + ผลทดสอบผ่าน + เอกสารครบ

5

ส่งงานงวด & เบิกเงิน (Progress Billing)

หน้า 6

เมื่อไร: เมื่อทำงานครบเนื้อหาของแต่ละงวดตามสัญญา

หนังสือส่งมอบงานงวด ใบตรวจรับงาน ใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี 50 กร
ใบเสร็จ

✓ ผ่านด้านเมื่อ: ได้ใบตรวจรับงวด + ได้รับเงิน → วงงวดถัดไป

งวดสุดท้าย

6

ส่งมอบงาน & ปิดโครงการ (Handover)

หน้า 7

เมื่อไร: งานเสร็จ ~90-95% → ทดสอบระบบ → ส่งงวดสุดท้าย

Punch List ผลทดสอบระบบ (T&C) As-built Drawing คู่มือ O&M
ใบรับประกัน หนังสือรับมอบงาน

✓ ผ่านด้านเมื่อ: ได้ใบตรวจรับงวดสุดท้าย = วันเริ่มนับระยะรับประกัน

7

ระยะรับประกัน & คืนหลักประกัน (DLP)

หน้า 8

เมื่อไร: ตลอดระยะรับประกันตามสัญญา (เช่น 1-2 ปี)

ทะเบียนแจ้งซ่อม บันทึกการซ่อม หนังสือขอคืนหลักประกัน
หนังสือรับรองผลงาน

✓ ผ่านด้านเมื่อ: ได้หลักประกันคืน + ยกเลิก LG กับธนาคาร

ปิดแฟ้มโครงการ (Archive)

ใครเป็นใคร (สีของกล่อง)

PE / ทีมหน้างาน (เรา)

จัดทำ ตรวจ ยื่น ติดตาม สแกน

บริษัท (ผู้บริหาร · บัญชี · การเงิน)

ลงนามผู้มีอำนาจ ประทับตรา ออกเอกสารการเงิน

ผู้ว่าจ้าง / ที่ปรึกษา (CM) / ผู้ควบคุมงาน /

กก.ตรวจรับ

พิจารณา อนุมัติ ตรวจสอบ จ่ายเงิน

ภายนอก

ธนาคาร · บริษัทประกัน · สรรพากร · การไฟฟ้า/

ประปา · กองดิน · แส้ทดสอบ

สัญลักษณ์ใน Flow

เริ่ม / จบ

จุดเริ่ม-จุดจบของขั้นตอน

1.2

ขั้นตอนงาน (มีเลขข้อ)

◇

จุดตรวจ/ตัดสินใจ (ผ่าน/ไม่ผ่าน)

□

สแกน + จัดเก็บ (ระบุ Folder)

❌

ไม่ผ่าน → แก้ไข แล้ววนกลับ

□

ทำพร้อมกันได้ (Parallel)

→

ลำดับงานปกติ

→

เส้นทาง “ไม่ผ่าน”

ป้ายกำกับ

📄 ยื่น

ส่งออก ต้องได้ลายเซ็นรับ

📄 รับกลับ

ได้เอกสารคืน ต้องตรวจก่อนเก็บ

📄 ลงนาม/ตรา

ต้องมีผู้มีอำนาจเซ็น

📄 ภาครัฐ

ขั้นตอนเฉพาะงานราชการ / e-GP

🔗 วงจรเอกสาร 1 ฉบับ (ใช้กับทุกเอกสาร)

1. เตรียม + ใส่เลขที่จาก Register

2. ตรวจภายใน → ผู้มีอำนาจลงนาม/ประทับตรา

3. สแกนฉบับที่ส่ง → ยื่นพร้อมใบนำส่ง

4. ให้ผู้รับเซ็นรับ + วันที่/เวลา (หรือตรารับ)

5. ติดตามจนได้ค่าตอบ

6. รับกลับ → ตรวจลายเซ็น/ตรา/วันที่/ครบหน้า

7. สแกน → ตั้งชื่อ → เก็บ Folder → อัปเดต Register

รายละเอียด: หน้า 9 (วงจรเอกสาร) · หน้า 10 (ตรวจลายเซ็น/ตรา) · หน้า 11 (สแกน/จัดเก็บ)

☰ สารบัญ

1 ภาพรวม (หน้านี้)

2-8 Flow ละเอียด Phase 1-7

9 วงจรเอกสารขาออก / ขาเข้า

10 ตรวจสอบลายเซ็นตราประทับ ความถูกต้อง

11 มาตรฐานสแกน ตั้งชื่อไฟล์ จัดเก็บ

12-13 ตารางสรุปเอกสารทั้งหมด (ทำเมื่อไร/ยื่นใคร)

14 10 ข้อที่ PE ใหม่ต้องจำ + คำศัพท์

ทำสัญญา — เตรียมเอกสาร ลงนาม และรับสัญญากลับมา

เริ่ม: ได้รับหนังสือแจ้งผล/เชิญทำสัญญา · จบ: มีสัญญาลงนามครบ สแกนแล้ว และสรุปสัญญา 1 หน้าพร้อมใช้

ได้รับหนังสือแจ้งผล / เชิญทำสัญญา / ใบสั่งจ้าง
จากผู้ว่าจ้าง (ภาครัฐมักแจ้งผ่านระบบ e-GP + หนังสือ)

1.1 ลงรับ + จัดวันครบกำหนดการทำสัญญา

PE

ประทับตรารับ (เลขรับ/วันที่/เวลา) · แจ้งผู้บริหาร-บัญชี-การเงินทันที
เพราะหลักประกันต้องใช้เวลามากกว่าการ

📄 สแกน

01_Contract · หนังสือเชิญ

1.2 ขอร่างสัญญา + ตรวจสอบ TOR / BOQ / ใบเสนอราคา

PE

- ชื่องาน สถานที่ วงเงิน (รวม VAT หรือไม่) ตัวเลข = ตัวอักษร
- ระยะเวลาก่อสร้าง วันเริ่ม-วันสิ้นสุด · งวดงาน-งวดเงิน
- ค่าปรับต่อวัน · หลักประกัน % · ระยะเวลาประกันผลงาน
- เงินล่วงหน้า · เงินประกันผลงาน (Retention) · ประกันภัย

ข้อความ/ตัวเลข ถูกต้อง
ครบ?

ไม่ถูก

ทำหนังสือขอแก้ไข / สอบถาม
ส่งผู้ว่าจ้างก่อนวันลงนาม · สแกน
เก็บ

ถูกต้อง

1.3 เตรียมเอกสารทำสัญญา — ทำพร้อมกัน ตามรายการในหนังสือเชิญ

หลักประกันสัญญา

ขอ LG จากธนาคาร (การเงิน) ·
ภาครัฐ ปกติ 5% ของวงเงิน ใช้
แบบฟอร์ม/e-LG ตามที่กำหนด

หนังสือรับรองบริษัท

ฉบับใหม่ อายุไม่เกินที่กำหนด (เช่น 3-
6 เดือน) + สำเนาบัตรกรรมการ
รับรองสำเนา

หนังสือมอบอำนาจ

ถ้ากรรมการไม่ไปลงนามเอง · ติด
อากร 10 บ. (ครึ่งเดียว) / 30 บ.
(หลายครั้ง) + ชัดข่าว

เอกสารอื่นตามหนังสือเชิญ

เช่น ภ.พ.20, BOQ ฉบับสุดท้าย, แผน
งานเบื้องต้น, รายชื่อวิศวกร

LG ถูกต้อง? (ดูกล่องขวา)

ไม่ถูก

แจ้งธนาคารแก้ไข LG
ผ่านฝ่ายการเงิน

ถูกต้อง

1.4 ยื่นเอกสาร + ลงนามสัญญา

บริษัท ↔ ผู้ว่าจ้าง

📄 ยื่น LG + เอกสารนิติบุคคล · 📄 ลงนาม/ตรา กรรมการผู้มีอำนาจตาม
หนังสือรับรอง (+ตรา ถ้ากำหนด) · พยาน 2 คน · ลงชื่อย่อทุกหน้า

1.5 ชำระอากรแสตมป์สัญญา

บัญชี → สรรพากร

สัญญาจ้างทำของ: 1 บาท ต่อทุก 1,000 บาท (หรือเศษ) · ผู้รับจ้างเป็นผู้
เสีย · ติดอากร+ชัดข่าว หรือชำระผ่าน e-Stamp Duty → เก็บหลักฐานการ
ชำระไว้กับสัญญา

1.6 รับสัญญาคู่ฉบับกลับ + ตรวจสอบครบถ้วน

PE

📄 รับกลับ ตรวจสอบ Checklist ขวามือ ก่อนออกจากห้องลงนามได้ยิ่งดี

📄 สแกนสิ่งที่ส่ง

01_Contract · รวมภาคผนวก +
LG + ใบเสร็จอากร

1.7 เก็บต้นฉบับ + ทำ “สรุปสัญญา 1 หน้า” + ตั้ง ปฏิทินเตือน

PE / บริษัท

ต้นฉบับสัญญา + สำเนา LG → ตู้เซฟสำนักงาน · สำเนาใช้งานหน้างาน · ส่ง
สรุปให้ PM, บัญชี, จัดซื้อ

ไป Phase 2 — เตรียมเริ่มงาน

🔍 ตรวจสอบ LG ก่อนยื่น

- ☐ ผู้รับประกัน = ชื่อผู้ว่าจ้างถูกต้องตามสัญญา
- ☐ จำนวนเงิน ตัวเลข = ตัวอักษร = % ที่กำหนด
- ☐ ชื่อโครงการ / เลขที่ประกาศ / เลขที่สัญญา ตรง
- ☐ ระยะเวลาชำระ ครอบคลุมถึงสิ้นสุดระยะรับประกัน (ถ้ากำหนด)
- ☐ ใช้แบบฟอร์มตามผู้ว่าจ้างกำหนด · ลายเซ็นผู้มี
อำนาจธนาคาร

✓ ตรวจสอบสัญญาที่ได้กลับ (1.6)

- ☐ ลายเซ็นผู้ว่าจ้าง + ชื่อตัวบรรจง + ตำแหน่ง ครบทุก
จุด
- ☐ ลายเซ็นฝ่ายเรา ตรงกับผู้มีอำนาจ + ตราบริษัท (ถ้า
กำหนด)
- ☐ พยาน ลงนามครบ 2 คน
- ☐ เลขที่สัญญา + วันที่ลงนาม เขียนครบ ไม่เว้นว่าง
- ☐ ลงชื่อย่อทุกหน้า · จุดแก้ไข/ขีดฆ่ามีลายเซ็นกำกับ
- ☐ ภาคผนวกครบ: TOR, BOQ, แบบ, เงื่อนไข, แผน
งวด
- ☐ จำนวนหน้าเรียงครบ ไม่มีหน้าหาย/ซ้ำ
- ☐ อากรแสตมป์ติดครบ/ชัดข่าว หรือมีหลักฐาน e-
Stamp

📄 “สรุปสัญญา 1 หน้า” ต้องมี

- เลขที่สัญญา · วันลงนาม · วันเริ่ม-วันสิ้นสุด · จำนวน
วัน
- วงเงิน · ตารางงวดงาน-งวดเงิน
- ค่าปรับต่อวัน · เงื่อนไขขยายเวลา
- หลักประกัน: เลขที่ LG / ธนาคาร / วันหมดอายุ
- เงินล่วงหน้า · Retention · ระยะเวลาประกัน
- ผู้ติดต่อ/ผู้ควบคุมงาน · ที่อยู่ส่งหนังสือตามสัญญา

⚠️ ระวัง

- ดูหนังสือรับรองบริษัท ข้อ “กรรมการผู้มีอำนาจ”
ต้องลงนามที่คน ต้องประทับตราหรือไม่
- ขอ LG ซ้ำ = ทำสัญญาไม่ทัน อาจถูกปรับหลักประกัน
ของ/ถูกโกง
- ห้ามเซ็นแทน ห้ามแก้ไขเอกสารที่ลงนามแล้วเอง

ได้สัญญาแล้ว (จาก Phase 1)

2.1 ประชุมเริ่มโครงการภายในบริษัท (Internal Kick-off)

PE + บริษัท

แจกสรุปสัญญา 1 หน้า · กำหนดทีม/งบประมาณ · จัดซื้อเริ่มหาวัสดุที่ใช้เวลาผลิตนาน (Long lead)

2.2 จัดทำเอกสารยื่นผู้ว่าจ้าง – ทำพร้อมกัน ภายในวันที่สัญญากำหนด

แผนการทำงาน

Master Schedule (Bar chart) + S-Curve + แผนงานงาน

ผังองค์กรโครงการ

PM / PE / โพรแมน / จป. + สำเนาใบทว. (รับรองสำเนา)

ประกันภัย CAR / บุคคลภายนอก

ถ้าสัญญากำหนด · ระบุชื่อผู้ว่าจ้างตามเงื่อนไข

แผนความปลอดภัย

+ แผนสิ่งแวดล้อม / จราจร (ถ้าสัญญา/EIA กำหนด)

Submittal Schedule

รายการแบบ/วัสดุที่ต้องขออนุมัติ + วันที่ต้องได้

ขอเบิกเงินล่วงหน้า (ถ้ามี)

+ หลักประกันเงินล่วงหน้า · ภาครัฐไม่เกิน 15%

ยื่นใหม่

2.3 ยื่นพร้อมใบนำส่ง (Transmittal)

PE → ผู้ว่าจ้าง

☑ ยื่น ให้ผู้รับเซ็นรับ + วันที่ หรือประทับตรารับ + เลขรับ

☒ สแกนฉบับส่ง

02_Letters/OUT + ใบนำส่งที่เซ็นรับ

อนุมัติ / รับทราบ?

ไม่ผ่าน

แก้ตามคอมเมนต์

Rev.+1 แล้วยื่นใหม่

ผ่าน

2.4 รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน (Notice to Proceed)

ผู้ว่าจ้าง → PE

☑ รับกลับ ลงรับ → ตรวจวันเริ่มงาน → คำนวณวันสิ้นสุดสัญญา ลงปฏิทิน

☒ สแกน

01_Contract

2.5 รับมอบพื้นที่ + สำรวจร่วม

ผู้ว่าจ้าง + PE

ตรวจหมุดหลักฐาน (BM) ระดับ แนวเขต สภาพเดิม + ถ่ายรูป → บันทึกส่งมอบพื้นที่ ลงนาม 2 ฝ่าย

☒ สแกน + รูป

02_Letters · 10_Photos

2.6 เตรียมหน้างาน / ขออนุญาต – ทำพร้อมกัน

ไฟฟ้า-ประปาชั่วคราว

ยื่นการไฟฟ้า / การประปาในพื้นที่

ป้ายโครงการ + ใบอนุญาต

ติดป้าย (ภาครัฐ) ตามแบบกำหนด + สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างไว้หน้างาน

แคมปิคงาน / ใช้พื้นที่สาธารณะ

ขออนุญาต/แจ้งท้องถิ่น ถ้าต้องใช้

แรงงาน

ประกันสังคม / เงินทดแทน · ใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว

2.7 ตั้งระบบเอกสารหน้างาน

PE

Register (OUT/IN/Submittal/RFI) · ระบบเลขที่ · แฟ้ม · Folder บน Cloud · แบบฟอร์ม Daily / Transmittal / ใบขอตรวจงาน → ดูหน้า 11

2.8 ประชุมเริ่มงานกับผู้ว่าจ้าง (Kick-off)

ผู้ว่าจ้าง + PE

ตกลง: ผู้มีอำนาจสั่งงาน · ช่องทางส่งเอกสาร · รอบประชุม · รูปแบบรายงาน/รหัสสถานะอนุมัติ → MOM ลงนามทุกฝ่าย

☒ สแกน MOM

06_MOM

เริ่มก่อสร้าง → Phase 3 และ 4

✓ ตรวจสอบเมื่อได้รับกลับ

หนังสือให้เริ่มงาน

☐ ระบุวันเริ่มงานชัดเจน · ผู้ลงนามมีอำนาจ☐ เลขที่สัญญา/ชื่อโครงการตรง

บันทึกส่งมอบพื้นที่

☐ ลงนามครบทั้ง 2 ฝ่าย + วันที่☐ แบบผังหมุด + ค่าระดับ + รูปสภาพเดิม☐ ระบุพื้นที่ที่ยังส่งมอบไม่ได้ (ถ้ามี)

แผนงานที่อนุมัติ

☐ ตารางอนุมัติ + ลายเซ็น + วันที่ → ใช้เป็น Baseline

กรรมสิทธิ์ประกันภัย

☐ ชื่อผู้เอาประกัน/ผู้รับประกันภัยตามสัญญา☐ ทุนประกัน + ระบุคุ้มครองครอบคลุมทั้งโครงการ

📅 จัดลงปฏิทินทันที

• วันเริ่ม – วันสิ้นสุดสัญญา

• กำหนดส่งเอกสารตามสัญญา (แผนงาน ฯลฯ)

• กำหนดแล้วเสร็จของแต่ละงวดงาน

• วันหมดอายุ: LG · ธรรมชาติ · ใบ ทว. ของทีม

⚠️ ระวัง

• ห้ามเข้าทำงานก่อนได้หนังสือให้เริ่มงานและรับมอบพื้นที่เป็นลายลักษณ์อักษร

• ส่งมอบพื้นที่ช้า/ไม่ครบ → ทำหนังสือแจ้งทันที เพื่อรักษาสัญญาหรือขยายเวลา

• วันเริ่มสัญญา = วันเริ่มนับเวลาและค่าปรับ

🔍 เคล็ดลับ

ภายใน Kick-off ให้คิดว่า “ใครมีอำนาจสั่งงาน/อนุมัติ” และ “ส่งเอกสารช่องทางไหนถือว่าส่งแล้ว” แล้วให้อยู่ใน MOM

ถึงเวลาต้องใช้แบบ / วัสดุ / วิธีการงาน
ดูจาก Submittal Schedule

3.1 จัดทำเอกสารขออนุมัติ

PE

- Shop Drawing — แบบขยายสำหรับก่อสร้างจริง
- Material Submittal — แคตตาล็อก, ตารางเทียบ Spec, มอก., ผลทดสอบ, ตัวอย่างจริง
- Method Statement — ขั้นตอน เครื่องจักร การควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย

D → เสนอใหม่

3.2 ใส่เลขที่ + Rev. จาก Register + ใบปะหน้า

PE

เช่น P2601-SD-ST-012 Rev.0 ใช้ Submittal Form มาตรฐานของโครงการ

C → แก้ Rev.+1

3.3 ตรวจสอบภายใน + ลงนาม

PE → PM

ลงนาม ช่อง “ผู้จัดทำ / ผู้ตรวจ” · ตรวจสอบว่าตรงแบบสัญญาและ Spec

3.4 ยื่นพร้อมใบนำส่ง (Transmittal)

PE → CM

ยื่น ให้ผู้รับเซ็นรับ + วันที่ · ตัวอย่างวัสดุติดป้ายเลขที่

สแกนฉบับส่ง
03_Submittal + ใบนำส่ง

3.5 ลง Register + ติดตาม

PE

วันที่ส่ง · กำหนดตอบตามสัญญา (เช่น 7-14 วัน) · ทวงในประชุมประจำสัปดาห์ และบันทึกใน MOM

3.6 รับเอกสารกลับ + ตรวจสอบ

CM → PE

รับกลับ ตราสถานะ · ลายเซ็น · วันที่ · อ่านคอมเมนต์ทุกหน้า

สถานะที่ได้?

C / D

C หรือ D = ห้ามใช้

C แก้ → Rev.+1 → กลับ 3.2

D เสนอใหม่ → กลับ 3.1

3.7 สแกนทุกหน้า + อัปเดต Register

PE

รวมหน้าคอมเมนต์/แบบที่เขียนเมื่อ · ใส่สถานะ + วันที่ได้รับ + ลิงก์ไฟล์

สแกน
03_Submittal

3.8 แจกจ่ายหน้างาน (Controlled Copy)

PE

ประทับ “ใช้ก่อสร้างได้” · B = แก้ตามคอมเมนต์ทุกข้อ · เก็บ Rev. เก่าออกประทับ “ยกเลิก / SUPERSEDED”

สั่งซื้อวัสดุ / เริ่มทำงาน → Phase 4

รหัสสถานะ (ที่ใช้ทั่วไป)

- A Approved** อนุมัติ
ใช้ก่อสร้าง/สั่งซื้อได้
- B Approved as Noted** อนุมัติตามคอมเมนต์
ใช้ได้ ต้องแก้ตามคอมเมนต์ (บางโครงการให้ส่ง Rev. ใหม่)
- C Revise & Resubmit** แก้ไขส่งใหม่
ห้ามใช้
- D Rejected** ไม่อนุมัติ
ห้ามใช้ ต้องเสนอใหม่

รหัสแต่ละโครงการอาจต่างกัน ยึดตามที่ตกลงใน Kick-off

✓ ตรวจสอบเมื่อได้รับกลับ (3.6)

- ☐ ตราสถานะชัดเจน (A/B/C/D)
- ☐ ลายเซ็นผู้พิจารณา + ชื่อ + วันที่
- ☐ เลขที่ / Rev. ตรงกับที่ส่งไป
- ☐ ได้คืนครบทุกแผ่น/ทุกหน้า
- ☐ อ่านคอมเมนต์ทุกหน้า รวมทั้งเขียนเมื่อในแบบ
- ☐ คอมเมนต์ที่ทำให้ราคา/เวลาเปลี่ยน → แจ้งเป็นหนังสือทันที (ใน VO/EOT หน้า 5)

RFI — เมื่อแบบไม่ชัด/ขัดกัน

ใช้วงจรเดียวกันนี้: 1 เรืองต่อ 1 ฉบับ · เขียนคำถาม + เสนอทางแก้ + รูป/แบบอ้างอิง → ยื่น → ขอคำตอบเป็นลายลักษณ์อักษร → ถ้ากระทบราคา/เวลา → VO / EOT

คอลัมน์ Submittal Register

เลขที่ · เรื่อง · Rev. · วันส่ง · กำหนดตอบ · วันได้รับ · สถานะ · ลิงก์ไฟล์ · หมายเหตุ

เมื่อวัสดุเข้าหน้างาน

- ☐ เก็บกับตัวอย่างที่อนุมัติแล้ว (ให้ CM เขียนบนป้ายตัวอย่าง เก็บห้อง Sample)
- ☐ ตรวจสอบใบส่งของ + ใบรับรอง/มอก./Mill cert ตรงรุ่นที่อนุมัติ
- ☐ ถ้าบันทึกตรวจสอบวัสดุ ให้ CM เขียน → สแกน 07_Test
- ☐ ไม่ตรง → แยกกองติดป้าย “ห้ามใช้” แจ้งจัดซื้อคืนของ

⚠ ระวัง

- ห้ามใช้แบบ/วัสดุที่ยังไม่ได้ A หรือ B
- ห้ามส่งของก่อนอนุมัติ (ถ้าไม่ผ่าน = ของค้าง)
- หน้างานต้องมีแต่ Rev. ล่าสุด เท่านั้น

ตัวอย่าง: ใบนำส่งเอกสาร (Transmittal) ต้องมีอะไรบ้าง

ใบนำส่งเอกสาร TRANSMITTAL		1 เลขที่ P2601-TR-0045 วันที่ 5 ต.ค. 2569	
โครงการ: อาคารสำนักงาน 5 ชั้น · สัญญาเลขที่ 12/2569		ถึง: ผู้ควบคุมงาน / CM	
จาก: PE โครงการ			
ลำดับ	2 เลขที่เอกสาร	Rev.	รายการ
1	P2601-SD-ST-012	1	Shop Drawing ฐานราก F1-F3
2	P2601-MAT-AR-004	0	วัสดุกันซึมลาดฟ้า + ตัวอย่างจริง 1 ชั้น
3 วัตถุประสงค์: ☒ เพื่ออนุมัติ ☐ เพื่อทราบ ☐ ตามที่ขอ ☐ แก้ไขส่งใหม่ · ขอคำตอบภายใน: 19 ต.ค. 2569			
ผู้ส่ง ลงชื่อ		4 ผู้รับ ลงชื่อ วันที่ เวลา	


1 เลขที่จาก Register ไม่ซ้ำ

3 บอกว่าส่งเพื่ออะไร + วันที่ต้องได้คำตอบ


2 เลขที่ + Rev. ตรงกับเอกสารที่แนบจริง

4 สำคัญที่สุด ลายเซ็นผู้รับ + วัน/เวลา = หลักฐานว่าส่งแล้ว → สแกนเก็บทุกครั้ง

รอบประจำ — ทำซ้ำตลอดโครงการ

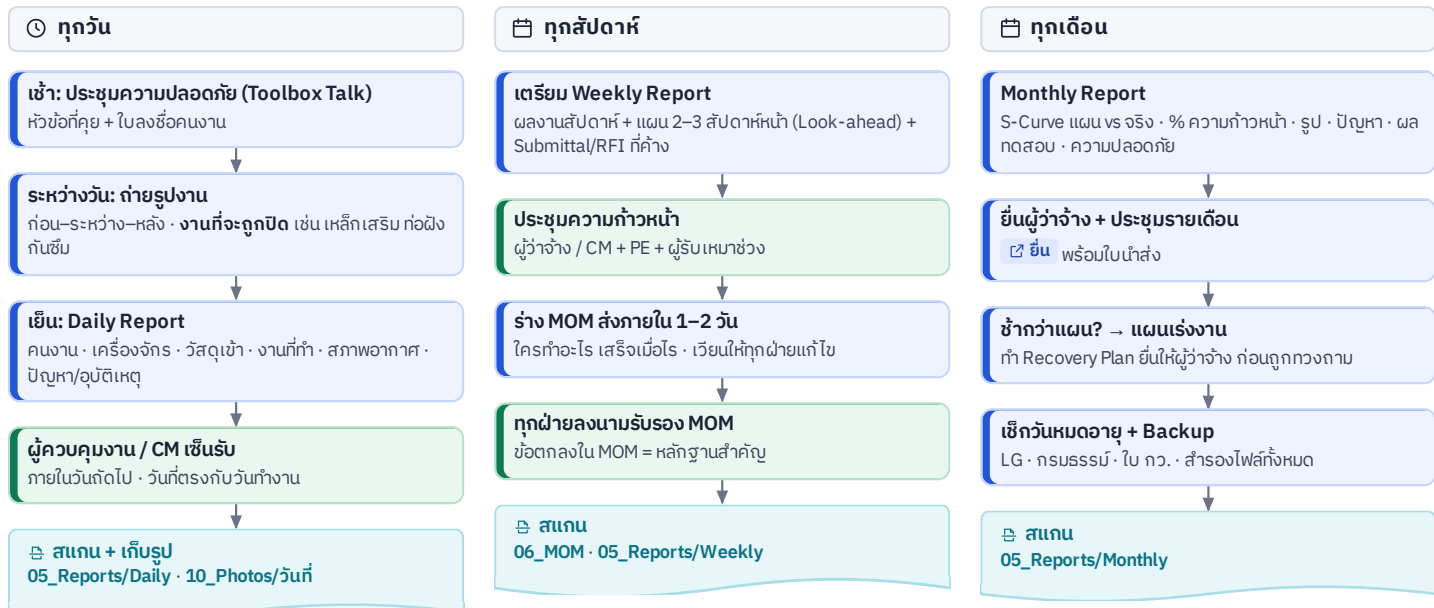

งานตามเหตุการณ์ — ทำทุกครั้งที่เกิด

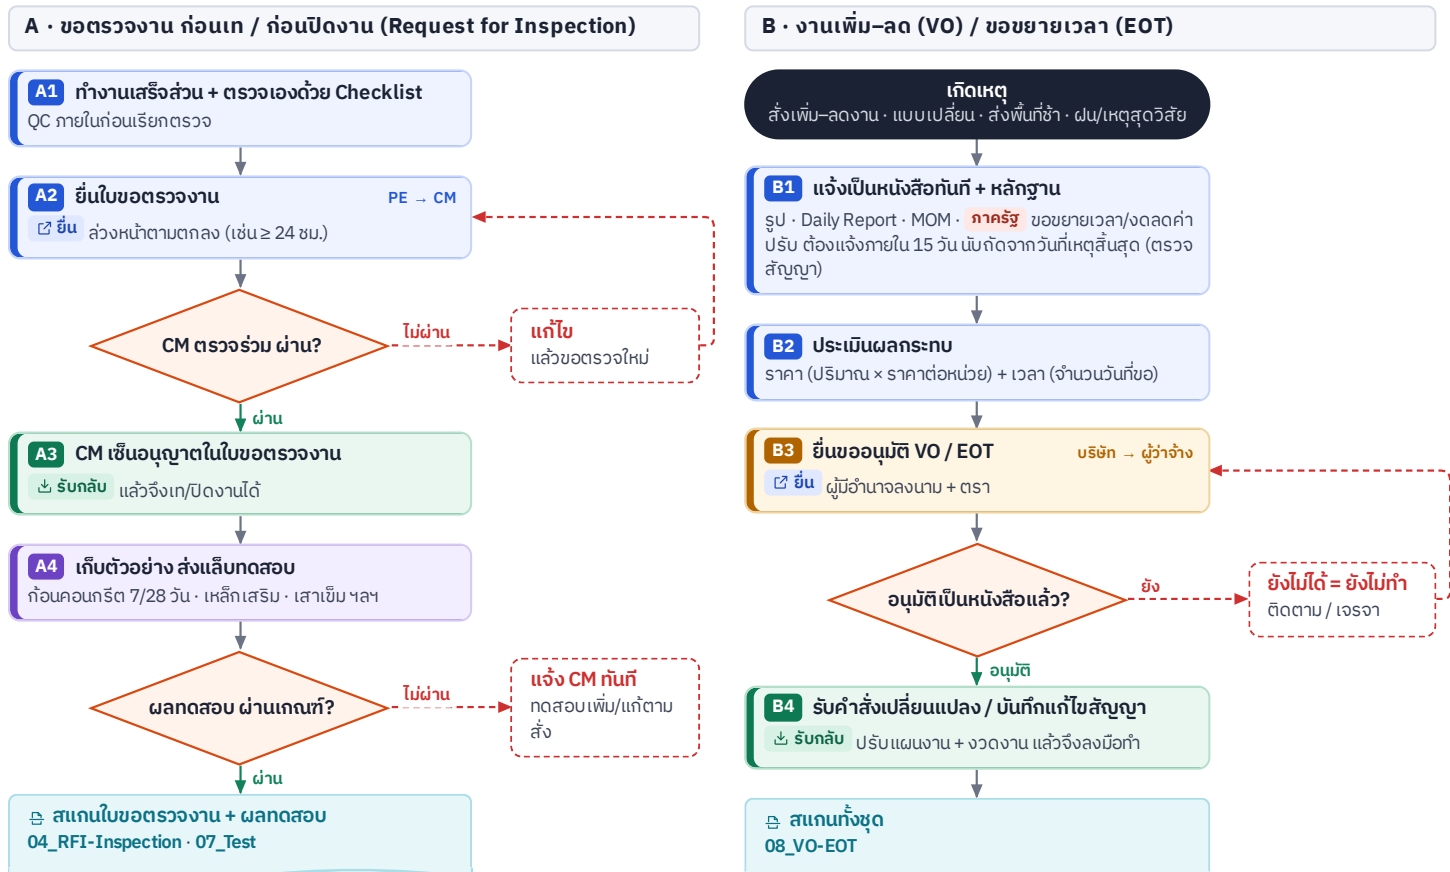

✓ ตรวจเมื่อได้รับกลับ — เอกสาร Phase 4

DAILY REPORT

- ☐ ลายเซ็น CM + วันที่
- ☐ วันที่ในรายงาน = วันทำงานจริง
- ☐ ไม่มีช่องว่าง

MOM

- ☐ ทุกฝ่ายลงนามครบ
- ☐ ข้อความตรงที่ตกลงจริง
- ☐ แจ้งภายในกำหนด (ถ้ามี)

ใบขอตรວจงาน

- ☐ ผลตรวจ “ผ่าน” ชัดเจน
- ☐ ลายเซ็นผู้ตรวจ + วันที่/เวลา
- ☐ ระบุตำแหน่ง/Grid ของงาน

ผลทดสอบจากแล็บ

- ☐ ลายเซ็นผู้ทดสอบ/ผู้รับรอง + ตราแล็บ
- ☐ รหัสตัวอย่าง/วันหล่อ ตรงบันทึก
- ☐ ค่าที่ได้ ≥ ค่าที่ Spec กำหนด

⚠️ กฎเหล็ก: คำสั่งด้วยวาจาหน้างาน

ทำ “หนังสือยืนยันคำสั่ง” (Confirmation of Verbal Instruction) ภายใน 1-2 วัน ให้ผู้สั่งเซ็นรับ · **ไม่มีหนังสือ = ไม่มีหลักฐาน** ขอเวลาเพิ่มหรือเบิกค่างานเพิ่มไม่ได้

เนื้อหาางวดที่ N ใกล้เคียง

เทียบกับตารางงวดงานในสัญญา

5.1 ตรวจสอบเงื่อนไขตามสัญญา

PE

เนื้อหาครบทุกรายการที่ระบุ? ผลทดสอบ/เอกสารที่ต้องแนบ ครบหรือยัง?

5.2 ตรวจสอบภายใน (Self-inspection)

PE

ทำ Defect List เอง → แก้ให้เรียบร้อยก่อนเรียกผู้ว่าจ้างมาตรวจ

5.3 จัดชุดเอกสารส่งงวด

PE

- หนังสือส่งมอบงานงวดที่ N (ขอให้ตรวจรับ)
- สรุปผลงาน / ปริมาณงาน (% ตาม BOQ) + รูปก่อน-หลัง
- ผลทดสอบ + ใบขอตรวจงานที่ผ่านแล้ว · As-built ส่วนนั้น (ถ้ากำหนด)

5.4 ผู้มีอำนาจลงนาม + ประทับตรา

บริษัท

ลงนาม/ตรา หนังสือส่งมอบงาน (หนังสือทางการ)

5.5 ยื่นหนังสือ + ชุดเอกสาร

PE → ผู้ว่าจ้าง

ยื่น ขอเลขรับ + วันที่ = หลักฐานวันส่งงาน (ใช้คิดค่าปรับ) · สแกนฉบับส่ง → 09_Payment

5.6 ตรวจรับงานร่วมกับหน้างาน

ผู้ว่าจ้าง + PE

ผู้ว่าจ้าง / CM · ภาครัฐ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ + ผู้ควบคุมงาน · PE พาดตรวจ พร้อมเอกสาร

ผ่านการตรวจรับ?

ไม่ผ่าน

ขอรายการแก้ไขเป็นหนังสือ
แก้ไข → แจ้งพร้อมตรวจใหม่

ผ่าน

5.7 รับใบตรวจรับงานงวด

ผู้ว่าจ้าง → PE

รับกลับ ตรวจลายเซ็นกรรมการ/ผู้มีอำนาจครบทุกคน

สแกน
09_Payment/งวดN

5.8 วางบิล: ใบแจ้งหนี้ (+ ใบกำกับภาษี)

บัญชี → ผู้ว่าจ้าง

ยื่น ยอดสุทธิตามกล่องขวา · แนบสำเนาใบตรวจรับ · ขอใบรับวางบิล

5.9 รับเงิน + 50 ทวี → ออกใบเสร็จรับเงิน

ผู้ว่าจ้าง → บัญชี

รับกลับ ต้นฉบับ 50 ทวี ส่งบัญชี · อัปเดตตารางติดตามงวดเงิน

สแกนทั้งชุด
09_Payment/งวดN

เป็นงวดสุดท้าย?

ไม่ใช่

กลับ Phase 3-4
ทำงานงวดถัดไป

ใช่

ไป Phase 6 – ส่งมอบงาน

ⓧ ยอดเงินงวด (ลำดับทั่วไป)

มูลค่าางงวด (ก่อน VAT)

- หักคืนเงินล่วงหน้า ตาม % ที่สัญญากำหนด
- เงินประกันผลงาน / Retention (ถ้ามี)
- ค่าปรับ (ถ้าส่งงานล่าช้า)
- + VAT 7% ตามฐานที่บัญชีกำหนด
- ผู้ว่าจ้างหัก ณ ที่จ่ายจากยอดก่อน VAT: ภาครัฐ 1% · เอกชน 3% (ค่าจ้างทำของ)

วิธีหักจริงยึดตามสัญญา + ยืนยันกับบัญชีทุกครั้ง

✓ ตรวจสอบเมื่อได้รับกลับ

ใบตรวจรับงานงวด (5.7)

- ☐ ลงนามครบทุกคน ไม่มีช่องว่าง
- ☐ ระบุงวดที่ + วันที่ตรวจรับ
- ☐ ไม่มีเงื่อนไขค้าง (ถ้ามี ต้องมีรายการแนบ)

50 ทวี / เงินที่ได้รับ (5.9)

- ☐ ชื่อ + เลขผู้เสียภาษี 13 หลักของเราถูก
- ☐ ยอดเงินได้ + ภาษีหัก ถูกต้อง
- ☐ ลายเซ็นผู้จ่าย (+ตรา ถ้ามี)
- ☐ ยอดโอนตรงใบแจ้งหนี้ (ไม่ตรง → ถามทันที)

☰ ตารางติดตามงวดเงิน

งวด	ส่งงาน	ตรวจรับ	วางบิล	รับเงิน	50ทวี
1	✓	✓	✓	✓	✓
2	✓	✓	✓		
3					

ใส่วันที่จริงในแต่ละช่อง + ยอดเงิน · แชรกับบัญชี

⚠️ ระวัง

- งานไม่ครบตามงวด = ตรวจรับไม่ได้ เสียรอบ
- เก็บใบลงรับหนังสือส่งงานให้ดี ใช้พิสูจน์วันส่งงาน
- งานจ้างทำของ: ออกใบกำกับภาษีเมื่อไร ภาษีขายเกิดเมื่อไร → ถามบัญชีก่อนออก

งานก่อสร้างเสร็จ ~90-95%

6.1 ทดสอบระบบ (Testing & Commissioning)

PE + ผู้รับเหมาช่วง

ไฟฟ้า · ประปา-สุขาภิบาล · ดับเพลิง · ปรับอากาศ · ลิฟต์ → รายงานผลลงนามผู้ทดสอบ + CM

☞ สแกนผลการทดสอบ
07_Test

6.2 ตรวจสอบภายใน → Punch List → แก้จนเคลียร์

PE

6.3 ตรวจสอบก่อนส่งมอบ (Pre-final Inspection)

ผู้ว่าจ้าง/CM + PE

ได้ Defect List ร่วม ลงนาม 2 ฝ่าย + กำหนดวันแก้

Defect เคลียร์ครบ?

ไม่ครบ

แก้ + รูปก่อน-หลัง
แล้วขอตรวจซ้ำ

ครบ

6.4 เอกสารส่งมอบ (CLOSE-OUT) — เริ่มทำคู่ขนานตั้งแต่ 6.1

As-built Drawing

ลงนามวิศวกร + เลข กว. · PDF + CAD

คู่มือใช้งาน & บำรุงรักษา

O&M Manual ทุกระบบ/อุปกรณ์

ใบรับประกันวัสดุ/อุปกรณ์

ออกในชื่อเจ้าของโครงการ

ผลการทดสอบทั้งหมด

+ ใบรับรองระบบ/ใบรับรองผู้ผลิต

กฎแฉ / อะไหล่ / เครื่องมือ

บัญชีรายการ + ใบส่งมอบ

บันทึกการอบรมผู้ใช้งาน

หัวข้อ + รายชื่อผู้เข้าอบรม

6.5 ยื่นหนังสือส่งมอบงานงวดสุดท้าย + ชุดเอกสาร

บริษัท → ผู้ว่าจ้าง

☞ ยื่น แบบใบนำเสนอแจ้งทุกรายการให้ผู้รับเซ็นรับ · สแกนฉบับส่ง → 12_Handover

ตรวจรับงวดสุดท้าย ผ่าน?

ไม่ผ่าน

แก้ไข
แล้วยื่นใหม่

ผ่าน

6.6 รับใบตรวจรับงวดสุดท้าย / หนังสือรับมอบงาน

ผู้ว่าจ้าง → PE

☞ รับกลับ วันที่รับมอบ = วันเริ่มนับระยะรับประกัน → จดบันทึก

☞ สแกน
12_Handover

6.7 ปิดงาน — ทำพร้อมกัน

เบิกเงินงวดสุดท้าย

ตามขั้นตอน Phase 5

ขอคืนหลักประกันเงินล่วงหน้า

เมื่อหักคืนครบแล้ว

ออกจากพื้นที่

ปลดมิเตอร์ชั่วคราว รื้อแคมป์/ป้าย
ทำความสะอาด (บันทึก + รูป)

ขอหนังสือรับรองผลงาน

ใช้ยื่นประมูลงานครั้งต่อไป

6.8 ปิดแฟ้มโครงการ

PE

Register ไม่มีรายการค้าง · ไฟล์สแกนครบทุก Folder · สรุปบทเรียน (Lessons Learned)

ไป Phase 7 — ระยะรับประกัน

✓ ตรวจสอบเมื่อได้รับกลับ

หนังสือรับมอบงาน / ใบตรวจรับงวดสุดท้าย

☐ ผู้มีอำนาจ/กรรมการลงนามครบ☐ ระบุวันที่รับมอบชัดเจน☐ ถ้ามีรายการค้าง ต้องมีรายการแนบ + กำหนดวันแก้

ใบนำเสนอเอกสารส่งมอบ

☐ ผู้รับเซ็นรับทุกรายการ + วันที่☐ จำนวนชุด/แผ่นตรงกับที่ส่งจริง

AS-BUILT DRAWING

☐ ลายเซ็น + เลข กว. วิศวกรตามสาขา☐ ตรงกับงานจริง · Rev. สุดท้าย

≡ ใบรับประกันที่มักต้องส่ง

● ระบบกันซึม / หลังคา

● ป้องกันปลวก

● อุปกรณ์ไฟฟ้า-เครื่องกล (ผู้ผลิต)

● ลิฟต์ / เครื่องปรับอากาศ / บิมน้ำ

● กรง/อะลูมิเนียม · สี · วัสดุพิเศษตาม Spec

ดูรายการจริงใน Spec / เจาะไขสัญญาณ

⚠ ระวัง

● ไม่มีหนังสือยืนยันวันรับมอบ = เทียบกันเรื่องวันเริ่มรับประกันภายหลัง

● เอกสารส่งมอบไม่ครบ อาจยังไม่ตรวจรับ/ไม่จ่ายงวดสุดท้าย

● ส่งกฎหมาย/อะไหล่ ต้องมีใบรับทุกครั้ง

🔍 เคล็ดลับ

เริ่มทำ As-built ตั้งแต่วันแรก: หน้างานต่างจากแบบ
เมื่อไร ให้มาร์กปากกาแดงในแบบชุดหน้างาน (Red-line)
ทันที ตอนจบจะไม่ต้องไล่ความจำ

ระยะรับประกัน & คืนหลักประกัน

เริ่ม: วันรับมอบงาน · ระยะ: ตามสัญญา (เช่น 1-2 ปี) · จบ: ได้หลักประกันคืน + ยกเลิก LG + ปิดแฟ้ม

เริ่มระยะรับประกัน
นับจากวันในหนังสือรับมอบงาน

7.1 ตั้งปฏิทินเตือน

PE

วันครบรับประกัน · วันหมดอายุ LG (ต้องครอบคลุม) · รอบตรวจสอบสภาพ (เช่น ทุก 6 เดือน)

7.2 รับแจ้งซ่อม → ลงทะเบียนแจ้งซ่อม

ผู้ว่าจ้าง → PE

รับ ทางหนังสือ/อีเมล/LINE → ขอให้ยืนยันเป็นหนังสือ · ใส่ Defect Log

7.3 ตรวจสอบงาน + ถ่ายรูป + หมายเหตุ

PE

อยู่ในความรับผิดชอบ ตามสัญญา?

ไม่ใช่

ตอบเป็นหนังสือ

พร้อมเหตุผล + หลักฐาน (เช่น ใช้งานผิดวิธี/ต่อเติม)

ใช่

7.4 ซ่อมภายในเวลาที่สัญญากำหนด

PE

รูปก่อน-หลัง → บันทึกการซ่อม ให้ผู้ว่าจ้างเซ็นรับงาน

สแกน
13_Warranty

ใกล้ครบระยะรับประกัน? (≤ 60 วัน)

ยัง

ยัง → รอรอบถัดไป
กลับ 7.2 เมื่อมีแจ้งซ่อม

ใช่

7.5 ตรวจสอบครั้งสุดท้าย

ผู้ว่าจ้าง + PE

แก้รายการที่เหลือ → ขอบันทึกว่าไม่มีรายการค้าง

7.6 ยื่นหนังสือขอคืนหลักประกันสัญญา + Retention

บริษัท → ผู้ว่าจ้าง

ยื่น เมื่อครบระยะ/พ้นข้อผูกพัน · ระบุเลขที่ LG + จำนวนเงิน

7.7 รับต้นฉบับ LG คืน / หนังสือแจ้งคืน + เงิน Retention

ผู้ว่าจ้าง → บริษัท

รับกลับ ตรวจสอบว่าเป็นต้นฉบับ + เลขที่/จำนวนเงินตรง

สแกน
01_Contract

7.8 ส่ง LG คืนธนาคาร / แจ้งยกเลิก

การเงิน → ธนาคาร

หยุดค่าธรรมเนียม + คืนวงเงินค้ำ → ขอหนังสือยืนยันการยกเลิก

7.9 ปิดแฟ้มการ (Archive)

PE / บริษัท

เอกสารบัญชี/ภาษี เก็บอย่างน้อย 5 ปี · สัญญา/แบบ/As-built เก็บตามนโยบายบริษัท

✓ ปิดโครงการสมบูรณ์

ระเบียบงานแจ้งซ่อม (Defect Log)

เลขที่แจ้ง · วันรับแจ้ง · ตำแหน่ง/อาคาร · สาเหตุ · อยู่ในประกัน? · วันเข้าซ่อม · วันเสร็จ · ผู้เซ็นรับงาน · ลิงก์รูป

✓ ตรวจสอบเมื่อได้รับกลับ

บันทึกการซ่อม

- ☐
- ผู้ว่าจ้างเซ็นรับงานซ่อม + วันที่
-
- ☐
- แบบรูปก่อน-หลัง ตรงตำแหน่ง

หนังสือคืนหลักประกัน

- ☐
- เลขที่ LG / ธนาคาร / จำนวนเงิน ตรง
-
- ☐
- ได้ต้นฉบับ LG คืนจริง (ไม่ใช่สำเนา)
-
- ☐
- เงิน Retention ได้ครบยอด

หนังสือยกเลิกจากธนาคาร

- ☐
- ระบุเลขที่ LG + วันที่ยกเลิก

⚠️ ระวัง

- ไม่ซ่อมในเวลาที่กำหนด → ผู้ว่าจ้างอาจจ้างคนอื่นซ่อมแล้วหักจากหลักประกัน
- สิ้นขอคืน LG = เสียค่าธรรมเนียมธนาคารต่อเนื่อง + วงเงินค้ำถูกกักไว้
- แจ้งซ่อมทาง LINE/โทร ต้องขอยืนยันเป็นหนังสือเสมอ

🔍 เคล็ดลับ

ถ้ายังไม่ได้รับหนังสือรับรองผลงานใน Phase 6 ให้ขอพร้อมหนังสือขอคืนหลักประกัน



✍ ขาออก (OUT) — เราส่งเอกสารออกไป

ต้องส่งเอกสารออก

1 ขอลงที่จาก Register + ใช้แบบฟอร์ม

หัวกระดาษ · เรื่อง · เรียน · อ้างถึง · สิ่งส่งมาด้วย

2 ตรวจสอบตนเอง

ชื่อโครงการ · เลขสัญญา · ตัวเลข/วันที่ · สิ่งแนบครบ

3 ผู้มีอำนาจลงนาม / ประทับตรา

เทคนิค → PM/PE · หนังสือทางการ/เงิน/สัญญา → กรรมการ + ตรา

ลงนามครบ ตามอำนาจ?

ไม่ครบ

แก้ / ขอลายเซ็นให้ครบ

ครบ

4 สแกนฉบับที่จะส่ง

+ ถ่ายสำเนาเก็บ 1 ชุด (ฉบับที่ส่งออกจริง)

5 ส่งพร้อมในน้ำส่ง

✍ ขึ้น ผู้รับเซ็นรับ + ชื่อ + วันที่ + เวลา หรือ ตรารับ + เลขรับ

6 ลง Register OUT

เลขที่ · วันที่ส่ง · ผู้รับ · กำหนดตอบ

สแกนใบรับเก็บคู่ฉบับส่ง

7 ติดตาม

โทรศัพท์กำหนด → ทวง (โทร + อีเมล + ในประชุม บันทึกลงใน MOM)

ได้คำตอบ / เอกสารคืน?

ยัง

ยัง → ทวงซ้ำ

ได้แล้ว

ไปวงจรขาเข้า (IN) →

📥 ขาเข้า (IN) — มีเอกสารเข้ามา / ได้เอกสารคืน

มีเอกสารเข้ามา

หนังสือ · เอกสารตอบกลับ · คำสั่ง

1 ประทับตรารับ

เลขรับ · วันที่ · เวลา · ผู้รับ · ถ้าเป็นการตอบกลับ ให้จับคู่กับเลขที่ส่งไป

2 ตรวจสอบความถูกต้อง

ลายเซ็น · ตรา · วันที่ · เลขที่/Rev. · ครบหน้า/สิ่งแนบ → หน้า 10

ถูกต้องครบ?

ไม่ครบ

แจ้งผู้ส่งขอแก้ไข
เป็นหนังสือ/อีเมล · Register = “ขอแก้ไข”

ครบ

3 สแกนภายในวันที่ได้รับ

ตั้งชื่อไฟล์ + วางใน Folder → หน้า 11

4 อัปเดต Register IN

ปิดรายการ OUT ที่ได้คำตอบแล้ว · ใส่ลิงก์ไฟล์

5 ตင်ฉบับเข้าแฟ้ม · สำเนาแจก

เรียงตามเลขรับ · แจกหน่วยงาน / จัดซื้อ / บัญชี ตามเรื่อง

ต้องตอบ / ต้องทำต่อ?

ต้อง

กำหนดวันตอบ
→ เริ่มวงจรขาออก

ไม่ต้อง

จบ — เก็บเข้าแฟ้ม

✍ ช่องทางส่ง & หลักฐานที่ต้องเก็บ

ช่องทาง	หลักฐานการส่ง
ส่งด้วยมือ	ลายเซ็นผู้รับ + วัน/เวลา บนใบนำส่ง หรือตรารับ + เลขรับ (ส่งที่งานสารบรรณ/ผู้รับหน้าทีรับ)
ไปรษณีย์ตอบรับ / EMS	ใบรับฝาก + ใบตอบรับ / ผลติดตามพัสดุ · ส่งถึงที่อยู่ตามสัญญาเท่านั้น
อีเมล / ระบบออนไลน์	อีเมลที่ส่ง + อีเมลตอบรับ · ใช้ได้เมื่อตกลงไว้ · หนังสือสำคัญส่งตัวจริงตาม
LINE / โทร	ไม่นับเป็นหนังสือ ใช้ประสานงานเท่านั้น → ยืนยันเป็นหนังสือเสมอ

📊 คอลัมน์ Register ที่ควรมี (Excel)

REGISTER OUT

เลขที่ · วันที่ · ถึง · เรื่อง · อ้างถึง · กำหนดตอบ · วันที่ได้คำตอบ · สถานะ · ลิงก์ไฟล์

REGISTER IN

เลขรับ · วัน/เวลา · จาก · เลขที่หนังสือ · เรื่อง · ต้องตอบภายใน · ผู้รับผิดชอบ · สถานะ · ลิงก์ไฟล์

ใช้สีแถว: เหลือง = รอคำตอบ · แดง = เลขกำหนด · เขียว = ปิดแล้ว

🕒 กฎภายในวันเดียว เอกสารเข้ามามีวันไหน → ลงรับ · ตรวจ · สแกน · ลง Register ให้จบในวันนั้น · ถ้ารอสะสมไว้ทำทีเดียว เอกสารจะหาย และจะลืมกำหนดตอบ



ใช้ทุกครั้งที่ได้เอกสารกลับมา และก่อนส่งออก · ไม่ผ่านข้อใดข้อหนึ่ง = ยังไม่ใช้ฉบับสมบูรณ์

ថ្ងៃត្រង់ PHASE

10 จุดที่ต้องตรวจ

- 1 **เลขที่ + วันที่** มีครบ ตรงกับ Register
- 2 **เรื่อง / เรียน** ถึงผู้มีอำนาจที่ถูกต้องตามสัญญา
- 3 **อ้างถึง** เลขที่สัญญา/หนังสือฉบับก่อน ถูกต้อง
- 4 **สิ่งที่ส่งมาด้วย** แนบครบตามจำนวนที่ระบุ
- 5 **จุดแก้ไข/ขัดข่า** มีลายเซ็นยกกำกับทุกจุด - ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด
- 6 **ลายเซ็น** หมึกจริง ครบทุกช่อง (ไม่ใช่สำเนา/ลายเซ็นสแกน เว้นแต่ตกลงไว้)
- 7 **ชื่อตัวบรรจง + ตำแหน่ง** ตรงกับผู้มีอำนาจ (หนังสือรับรอง / คำสั่งแต่งตั้ง / หนังสือมอบอำนาจ)
- 8 **ตราประทับ** ตราบริษัท/หน่วยงาน (ถ้ากำหนด) ชัดเจน - มาตรฐานะ (Approved ฯลฯ)
- 9 **ตรารับ** เลขรับ + วันที่ + เวลา + ผู้รับ = หลักฐานว่าส่งถึงแล้ว
- 10 **เลขหน้า** คสม x/y - สัญญาต้องลงชื่ออยู่ทุกหน้า

 ถ้าพบว่าไม่สมบูรณ์

- ยังไม่เข้าแฟ้มเป็นฉบับสมบูรณ์ → Register “รอแก้ไข”
- แจ้งผู้ส่งเป็นลายลักษณ์อักษร ขอดับแก้ไข/ขอลายเซ็นเพิ่ม
- ห้ามแก้ไข ห้ามเขียนแทน ห้ามประทับตราแทน

การรับรองสำเนาถูกต้อง

เขียน “**สำเนาถูกต้อง**” + ลงนามเจ้าของเอกสาร/ผู้มีอำนาจ (+ตรา ถ้ากำหนด) + เขียนกำกับ “**ใช้สำหรับ...เท่านั้น**” ถ้านำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

| ตรวจอะไรเพิ่ม แยกตามประเภทเอกสาร

เอกสาร	ใครต้องลงนาม	ตรา / อักษร	จุดตรวจพิเศษ
สัญญา / บันทึกแก้ไขสัญญา	ผู้มีอำนาจทั้ง 2 ฝ่าย + พยาน 2 คน	ตราบริษัท (ถ้ากำหนด) · อักษร เสตมปี	ลงชื่ออยู่ทุกหน้า · ภาคนวกรครบ · เลขที่/วันที่ลงนามไม่ว่าง
หนังสือคำประกัน (LG)	ผู้มีอำนาจของธนาคาร	ตามแบบของธนาคาร / e-LG	ผู้รับประกัน · วงเงิน · ระยะเวลา · ใช้แบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
หนังสือมอบอำนาจ	กรรมการผู้มีอำนาจ + ผู้รับมอบ + พยาน	อักษร 10 / 30 บาท + ชัดชัด · ตรา (ถ้ากำหนด)	ขอบเขตอำนาจครอบคลุมเรื่องที่จะทำ · ไม่หมดอายุ
สำเนาเอกสาร (บัตร, ใบ กว., หนังสือรับรอง)	เจ้าของเอกสาร / ผู้มีอำนาจ รับรองสำเนา	ตราบริษัท (ถ้ากำหนด)	เขียนวัตถุประสงค์กำกับ · เอกสารยังไม่หมดอายุ
หนังสือออก-เข้า (ทางการ)	ผู้มีอำนาจตามเรื่อง	ตราบริษัท/หน่วยงาน (ถ้า กำหนด) · ตรารับ	เลขที่ · อ้างถึงกฎฉบับ · ตรารับมีวัน/เวลา
Shop Drawing / Submittal	ผู้จัดทำ + ผู้ตรวจ (เรา) + ผู้พิจารณา (CM)	ตราสถานะ A/B/C/D	เลขที่ + Rev. ตรง · อ่านคอมเมนต์ทุกหน้า
แบบวิศวกรรม / As-built	วิศวกรผู้รับผิดชอบ + เลขทะเบียน กว.	—	สาขา/ระดับใบอนุญาตตรงงาน · เช็กสถานะใบ กว. ที่เว็บไซต์วิศวกร
Daily / MOM / ใบขอตรวจงาน	PE + CM (MOM = ทุกฝ่าย)	—	วันที่ตรงวันจริง · ไม่มีช่องเขียนว่าง · ผลตรวจชัดเจน
ผลการสอบวัสดุ	ผู้ทดสอบ + ผู้รับรอง (วิศวกร)	ตราห้องปฏิบัติการ	รหัสตัวอย่าง · วันหล่อ/วันทดสอบ · ค่าผ่านเกณฑ์ Spec
ใบตรวจรับงาน	กรรมการตรวจรับ / ผู้มีอำนาจ ครบทุกคน	ตราหน่วยงาน (ถ้ามี)	งวดที่ · วันที่ตรวจรับ · ไม่มีเงื่อนไขค้าง
ใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี	ผู้มีอำนาจ / ผู้รับเงิน	ตราบริษัท (ถ้ากำหนด)	เลขผู้เสียภาษี 13 หลัก + สาขา ทั้ง 2 ฝ่าย · ยอด VAT ถูก
50 ทวี	ผู้จ่ายเงิน	ตรา (ถ้ามี)	ชื่อ/เลขภาษีของเราถูก · ยอดเงินได้/ภาษีตรง · ต้นฉบับส่งบัญชี
กรรมธรรม์ประกันภัย	บริษัทประกันภัย	—	ผู้เอาประกัน/ผู้รับประกัน · ทุนประกัน · ระยะเวลาคุ้มครอง



ขั้นตอนสแกน-จัดเก็บ

- 1 ตรวจสอบเอกสาร หน้า 10
- 2 สแกน ตามตารางล่าง
- 3 ตรวจสอบไฟล์ คน - จัด - ไม่เอียง
- 4 ตั้งชื่อไฟล์ ตามรูปแบบ
- 5 วางใน Folder ตามหมวด
- 6 อัปเดต Register + ลิงก์ไฟล์
- 7 ตัวจริงเข้าแฟ้ม + Backup

ตั้งค่าการสแกน

ประเภทเอกสาร	ความละเอียด	สี	หมายเหตุ
สัญญา · LG · เอกสารการเงิน	300 dpi	สี	ทั้งเล่ม รวมปก/ภาคผนวก เป็น 1 ไฟล์
มีลายเซ็น/ตรา (หนังสือ, ใบตรวจรับ, Submittal ที่ได้คืน)	200-300 dpi	สี	เห็นสีหมึก/ตรา ใช้พิสูจน์ว่าเป็นต้นฉบับ
รายงานทั่วไป (Daily, Weekly)	200 dpi	เทา/สี	หน้าที่มีลายเซ็นให้ชัดเจน
แบบ A1-A3	300 dpi	สี	ใช้ PDF จาก CAD + สแกนเฉพาะแผ่นที่มีลายเซ็น/คอมเมนต์

บันทึกเป็น PDF · เปิด OCR ถ้าเครื่องทำได้ (ค้นหาข้อความได้) · 1 เอกสาร = 1 ไฟล์ ครอบคลุมหน้า

✓ ตรวจสอบไฟล์หลังสแกน

- ☐ จำนวนหน้าตรงกับตัวจริง ไม่ขาด/ไม่ซ้ำ
- ☐ เรียงหน้าถูก หน้าถูกทิศ ไม่เอียง ไม่ตกขอบ
- ☐ อ่านตัวเลข/ลายเซ็น/ตราได้ชัด
- ☐ รวมสิ่งแนบ/หน้าคอมเมนต์ ในไฟล์เดียวกัน
- ☐ ขนาดไฟล์เหมาะสม (ส่งอีเมลได้)
- ☐ ตั้งชื่อถูกรูปแบบ ก่อนย้ายเข้า Folder

รูปแบบชื่อไฟล์

P2601 - **SD** - **ST** - **012** - **R1** - **20261005** - **ฐานรากF1-F3** .pdf

รหัสโครงการ ประเภท สาขา (ถ้ามี) ลำดับ Rev. วันที่ ปปปปปดดว คำอธิบายสั้น

ตัวอย่าง P2601-OUT-0123_20261005_ขอส่งมอบงานงวด3.pdf

ตัวอย่าง P2601-MAT-AR-004_R0_20261003_กันซึมดาดฟ้า.pdf

ตัวอย่าง P2601-INS-0156_20261008_เทพื้นชั้น2-โซนA.pdf

ตัวอย่าง P2601-DR_20261008.pdf

วันที่ใช้ ปี-เดือน-วัน เพื่อให้เรียงตามเวลาอัตโนมัติ (ใช้ ค.ศ. หรือ พ.ศ. ก็ได้ แต่ต้องแบบเดียวกันทั้งโครงการ) · ไม่ใช้อักขระ / \ : * ? " < > |

รหัสประเภทเอกสาร

CON	สัญญา / หลักประกัน / ประกันภัย
OUT · IN	หนังสือออก · หนังสือเข้า
TR	ใบนำส่ง (Transmittal)
SD	Shop Drawing
MAT	ขออนุมัติวัสดุ
MST	Method Statement
RFI	ขอคำชี้แจง
INS	ใบขอตรวจงาน
DR · WR · MR	รายงานวัน / สัปดาห์ / เดือน
MOM	รายงานการประชุม
TST	ผลการทดสอบ
VO · EOT	งานเพิ่มลด · ขยายเวลา
PAY	ส่งงวด / วางบิล
ABD · OM · WTY	As-built · คู่มือ · ใบรับประกัน

สาขา: AR สถาปัตย์ · ST โครงสร้าง · EE ไฟฟ้า · SN สุขาภิบาล · ME เครื่องกล · FP ดับเพลิง · CV โยธา

โครงสร้าง Folder

P2601_ชื่อโครงการ/

- 00_Register ทะเบียน Excel ทั้งหมด
- 01_Contract สัญญา LG ประกันภัย NTP
- 02_Letters /IN · /OUT
- 03_Submittal /SD · /MAT · /MST · แผนงาน
- 04_RFI-Inspection
- 05_Reports /Daily · /Weekly · /Monthly
- 06_MOM
- 07_Test ผลทดสอบ ตรวจรับวัสดุ
- 08_VO-EOT
- 09_Payment /งวด01 · /งวด02 ...
- 10_Photos /ปปป-ด-ด-ด
- 11_Safety
- 12_Handover
- 13_Warranty

แฟ้มตัวจริง

- ตู้เซฟ/ตู้ล็อก สำนักงาน: สัญญา, LG, ใบตรวจรับ, เอกสารการเงิน
- แฟ้มหน้างาน: สำเนา + แบบ Controlled Copy
- สันแฟ้มใช้เลขหมวดเดียวกับ Folder + ช่วงเลขที่/วันที่
- ยื่นตัวจริงออก → ลงสมุดยืม-คืน

Backup 3-2-1

- 3 ชุด: เครื่อง + Cloud + ฮาร์ดดิสก์
- 2 สื่อที่ต่างกัน
- 1 ชุดอยู่นอกสำนักงาน
- สำรองอย่างน้อยทุกสัปดาห์

ตัวอย่าง Register (Excel) — หน้าตาประมาณนี้

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	เลขที่	วันที่ส่ง	ถึง	เรื่อง	Rev.	กำหนดตอบ	วันที่ได้คืน	สถานะ	ไฟล์
2	P2601-SD-ST-012	05/10/69	CM	Shop Drawing ฐานราก F1-F3	1	19/10/69	15/10/69	B · อนุมัติตามคอมเมนต์	ลิงก์
3	P2601-MAT-AR-004	03/10/69	CM	วัสดุกันซึมดาดฟ้า + ตัวอย่าง	0	17/10/69	—	รอคำตอบ	ลิงก์
4	P2601-RFI-009	20/09/69	ผู้ออกแบบ	ระดับท้องคานชั้น 2 ขัดกับแบบสถาปัตย์	—	27/09/69	—	เลยกำหนด · ทวงแล้ว 2 ครั้ง	ลิงก์
5	P2601-OUT-0123	05/10/69	ผู้ว่าจ้าง	ขอส่งมอบงานงวดที่ 3	—	—	06/10/69 (ลงรับ)	ปิดแล้ว	ลิงก์

สีแถว: รอคำตอบ เลยกำหนด ปิดแล้ว · ตั้ง Conditional Formatting ให้แถวเปลี่ยนสีเองเมื่อเลยกำหนดตอบ



เอกสาร	ทำ / ยื่นเมื่อไร	จาก → ถึง	ใครลงนาม / ตรา	ได้อะไรกลับ / ตรวจสอบอะไร	Folder
1 ทำสัญญา					
หนังสือแจ้งผล / เชิญทำสัญญา	ได้รับจากผู้ว่าจ้าง	ผู้ว่าจ้าง → เรา	ผู้มีอำนาจผู้ว่าจ้าง	ลงรับ · จัดวันครบกำหนดทำสัญญา	01
หลักประกันสัญญา (LG)	ก่อนวันลงนาม	ธนาคาร → บริษัท → ผู้ว่าจ้าง	ผู้มีอำนาจธนาคาร	สำเนา LG + หลักฐานการรับ · ตรวจสอบผู้รับประกัน/วงเงิน/ระยะเวลา	01
หนังสือรับรองบริษัท + สำเนาบัตรกรรมการ	ก่อนวันลงนาม	บริษัท → ผู้ว่าจ้าง	กรรมการ รับรองสำเนา (+ตรา)	อายุหนังสือรับรองไม่เกินที่กำหนด	01
หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามอบ)	ก่อนวันลงนาม	บริษัท → ผู้ว่าจ้าง	กรรมการ + ผู้รับมอบ + พยาน · อากร 10/30 บ.	ขอบเขตอำนาจครอบคลุมการลงนาม	01
สัญญาจ้าง + ภาคผนวก	วันนัดลงนาม	ลงนามร่วม 2 ฝ่าย	ผู้มีอำนาจ 2 ฝ่าย + พยาน 2 + ตรา	คู่ฉบับของเรา · ครบทุกหน้า/ภาคผนวก · ลงชื่อย่อทุกหน้า	01
อากรแสตมป์สัญญา / e-Stamp	เมื่อทำสัญญา (บัญชีดูกำหนด)	บัญชี → สรรพากร	—	หลักฐานการชำระ เก็บคู่กับสัญญา	01
สรุปสัญญา 1 หน้า	ภายใน 1-2 วันหลังได้สัญญา	PE → ทีม/บัญชี/จัดซื้อ	PE (PM ตรวจสอบ)	ใช้ภายใน · อัปเดตเมื่อแก้ไขสัญญา	01
2 เตรียมเริ่มงาน					
แผนการทำงาน / S-Curve	ภายในวันที่สัญญากำหนด	PE → ผู้ว่าจ้าง/CM	PM / PE	ฉบับอนุมัติ = Baseline ใช้วัดความก้าวหน้า	03
ผังองค์กร + สำเนาใบ กว.	พร้อมแผนงาน	PE → ผู้ว่าจ้าง	PM + รับรองสำเนา	หนังสือรับทราบ · ใบ กว. ไม่หมดอายุ	02
กรรมวิธี CAR / บุคคลภายนอก	ก่อนเข้าพื้นที่ (ถ้ากำหนด)	ปรึกษากัน → บริษัท → ผู้ว่าจ้าง	บริษัทปรึกษากัน	ผู้เอาประกัน · กุณประกัน · ระบุคู่คุ้มครอง	01
ขอเบิกเงินล่วงหน้า + หลักประกันเงินล่วงหน้า	หลังลงนาม (ถ้าสัญญาให้)	บริษัท → ผู้ว่าจ้าง	กรรมการ + ตรา · ธนาคาร	เงิน + 50 ทวี · จัดอัตราหักคืนต่องวด	09
หนังสือแจ้งให้เริ่มงาน (NTP)	ก่อนเริ่มงาน	ผู้ว่าจ้าง → เรา	ผู้มีอำนาจผู้ว่าจ้าง	วันเริ่มงาน → คำนวณวันสิ้นสุดสัญญา	01
บันทึกส่งมอบพื้นที่	วันรับมอบพื้นที่	ร่วม 2 ฝ่าย	ตัวแทน 2 ฝ่าย	ผังหลุด BM + ค่าระดับ + รูปสภาพเดิม	02
MOM ประชุมเริ่มงาน	ภายใน 1-2 วันหลังประชุม	PE → ทุกฝ่าย	ทุกฝ่าย	ผู้มีอำนาจสั่งงาน · ช่องทางส่งเอกสาร · รหัสสถานะ	06
3 ขออนุมัติก่อนทำ					
Shop Drawing	ก่อนทำงานส่วนนั้น 2-4 สัปดาห์	PE → CM	ผู้จัดทำ + ผู้ตรวจ (เรา) · CM	สถานะ A/B/C/D · อ่านคอมเมนต์ทุกหน้า	03
ขออนุมัติวัสดุ + ตัวอย่าง	ก่อนสั่งซื้อ (เผื่อ Lead time)	PE → CM	PE/PM · CM	สถานะ + ตัวอย่างที่ CM เห็นรับรอง	03
Method Statement	ก่อนเริ่มงานสำคัญ/งานเสี่ยง	PE → CM	PM · CM	สถานะอนุมัติ · ชี้แจงทีมงานก่อนทำ	03
RFI (ขอคำชี้แจง)	ทันทีที่แบบไม่ชัด/ขัดกัน	PE → CM/ผู้ออกแบบ	PE · ผู้ตอบ	คำตอบเป็นลายลักษณ์อักษร · ระบุงบราคา/เวลา → VO/EOT	04
4 ควบคุมงานก่อสร้าง					
Daily Report + รูปถ่าย	ทุกวัน	PE → CM	PE + CM	ฉบับที่ CM เห็นรับ · วันที่ตรงวันจริง	05 · 10
ใบขอตรวจงาน	ก่อนเท/ก่อนปิดงาน (เช่น ≥ 24 ชม.)	PE → CM	PE + ผู้ตรวจ	ผลตรวจ “ผ่าน” + ลายเซ็น + วัน/เวลา	04
ผลการทดสอบวัสดุ	ตามรอบทดสอบ (7/28 วัน ฯลฯ)	แล็บ → PE → CM	ผู้ทดสอบ + ผู้รับรอง + ตรา	ค่าผ่านเกณฑ์ Spec · รหัสตัวอย่างตรง	07
บันทึกตรวจสอบวัสดุเข้าหน้างาน	ทุกครั้งที่ยกเข้า	PE → CM	PE + CM	ตรงตัวอย่าง/รุ่นที่อนุมัติ · ใบรับรองผลิตภัณฑ์	07
Weekly Report + MOM	ทุกสัปดาห์	PE → ทุกฝ่าย	ทุกฝ่าย	MOM ลงนามครบ · แยกภายในกำหนดถ้าผิด	05 · 06
Monthly Report / Recovery Plan	ทุกเดือน / เมื่อช้ากว่าแผน	PE → ผู้ว่าจ้าง	PM	หลักฐานรับ · ความเห็นผู้ว่าจ้าง	05
หนังสือยืนยันคำสั่งด้วยวาจา	ภายใน 1-2 วันหลังได้คำสั่ง	PE → CM/ผู้สั่ง	PM · ผู้สั่งเห็นรับ	ลายเซ็นรับทราบของผู้สั่ง	02
ขอ VO (งานเพิ่ม-ลด)	ทันทีที่เกิด · ก่อนลงมือทำ	บริษัท → ผู้ว่าจ้าง	กรรมการ + ตรา	คำสั่งเปลี่ยนแปลง / บันทึกแก้ไขสัญญา	08
ขอยยเวลา / จัดลดค่าปรับ	ตามกำหนดสัญญา · ภาครัฐ ภายใน 15 วันนับถัดจากเหตุสิ้นสุด	บริษัท → ผู้ว่าจ้าง	กรรมการ + ตรา	หนังสืออนุมัติ · จำนวนวันที่ได้ · ปรับแผนงาน	08



เอกสารทั้งหมด — ส่งงวด · ส่งมอบ · รับประกัน

ใช้เป็น Checklist ประจำโครงการ · Folder = โครงสร้างในหน้า 11

เอกสาร	ทำ / ยื่นเมื่อไร	จาก → ถึง	ใครลงนาม / ตรา	ทำอะไรกลับ / ตรวจสอบอะไร	Folder
5 ส่งงานงวด & เบิกเงิน (ทุกงวด)					
หนังสือส่งมอบงานงวด + ชุดเอกสาร	เมื่อเนื่อกงานครบตามงวด	บริษัท → ผู้ว่าจ้าง	กรรมการ + ตรา	เลขรับ + วันที่ = วันส่งงาน (ใช้คิดค่าปรับ)	09
ใบตรวจรับงานงวด	หลังตรวจรับผ่าน	ผู้ว่าจ้าง → เรา	กรรมการตรวจรับ/ผู้มีอำนาจครบทุกคน	งวดที่ · วันที่ตรวจรับ · ไม่มีเงื่อนไขค้าง	09
ใบแจ้งหนี้ / ใบวางบิล (+ ใบกำกับภาษี)	หลังได้ใบตรวจรับ	บัญชี → ผู้ว่าจ้าง	ผู้มีอำนาจ (+ตรา)	ใบรับวางบิล · ยอดหักตามสัญญาถูกต้อง	09
50 ทวิ + ใบเสร็จรับเงิน	เมื่อได้รับเงิน	ผู้ว่าจ้าง ↔ บัญชี	ผู้จ่าย · ผู้รับเงิน	เลขภาษีเราถูก · ยอดตรง · ต้นฉบับส่งบัญชี	09
6 ส่งมอบงาน & ปิดโครงการ					
รายงานทดสอบระบบ (T&C)	ก่อนส่งมอบงวดสุดท้าย	PE → CM	ผู้ทดสอบ + CM	ผลผ่านทุกระบบ	07
Defect / Punch List ร่วม	ตรวจร่วมก่อนส่งมอบ	ร่วม 2 ฝ่าย	ตัวแทน 2 ฝ่าย	รายการ + กำหนดวันแก้ · รูปก่อน-หลัง	12
As-built Drawing	ก่อนส่งมอบงวดสุดท้าย	PE → ผู้ว่าจ้าง	วิศวกร + เลข กว.	ใบนำส่งเซ็นรับ · ตรงงานจริง	12
คู่มือ O&M + ใบรับประกัน + คุญแอะ/อะไหล่ + บันทึกอบรม	พร้อมส่งมอบงาน	PE → ผู้ว่าจ้าง	ผู้รับเซ็นรับทุกรายการ	ใบรับของ/ใบนำส่งรายการ	12
หนังสือส่งมอบงานงวดสุดท้าย	งานเสร็จ 100% + เอกสารครบ	บริษัท → ผู้ว่าจ้าง	กรรมการ + ตรา	เลขรับ + วันที่	12
ใบตรวจรับงวดสุดท้าย / หนังสือรับมอบงาน	หลังตรวจรับผ่าน	ผู้ว่าจ้าง → เรา	ผู้มีอำนาจ / กก.ตรวจรับ	วันรับมอบ = วันเริ่มนับรับประกัน	12
ขอคืนหลักประกันเงินล่วงหน้า	เมื่อหักคืนเงินล่วงหน้าครบ	บริษัท → ผู้ว่าจ้าง	กรรมการ + ตรา	ต้นฉบับหลักประกันคืน → ธนาคาร	01
บันทึกคืนพื้นที่ / ออกจากพื้นที่	หลังรื้อแคมป์ ปลดมิเตอร์	ร่วม 2 ฝ่าย	ตัวแทน 2 ฝ่าย	รูปพื้นที่สะอาด · ใบปลดมิเตอร์	12
หนังสือรับรองผลงาน	หลังรับมอบงาน	บริษัทขอ → ผู้ว่าจ้างออก	ผู้มีอำนาจผู้ว่าจ้าง	ต้นฉบับส่งฝ่ายประมูล · มูลค่า/ระยะเวลาถูก	12
7 ภาระรับประกัน & คืนหลักประกัน					
หนังสือแจ้งซ่อม + บันทึกการซ่อม	ตลอดระยะรับประกัน	ผู้ว่าจ้าง ↔ PE	ผู้ว่าจ้างเซ็นรับงานซ่อม	Defect Log · รูปก่อน-หลัง	13
บันทึกตรวจร่วมครั้งสุดท้าย	ก่อนครบระยะ ~30-60 วัน	ร่วม 2 ฝ่าย	ตัวแทน 2 ฝ่าย	ยืนยันว่าไม่มีรายการค้าง	13
หนังสือขอคืนหลักประกันสัญญา / Retention	เมื่อครบระยะรับประกัน	บริษัท → ผู้ว่าจ้าง	กรรมการ + ตรา	ต้นฉบับ LG คืน / เงิน Retention คsu	01
หนังสือยกเลิก LG กับธนาคาร	หลังได้ LG คืน	บริษัท → ธนาคาร	กรรมการ	หนังสือยืนยันการยกเลิก · หยุค่าธรรมเนียม	01

📅 วันสำคัญที่ต้องอยู่ในปฏิทินเสมอ

- วันครบกำหนดทำสัญญา · วันเริ่ม-วันสิ้นสุดสัญญา
- กำหนดส่งเอกสารตามสัญญา (แผนงาน ฯลฯ)
- กำหนดแล้วเสร็จแต่ละงวดงาน
- กำหนดตอบของ Submittal / RFI ที่ค้าง
- วันหมดอายุ LG · ธรรมเนียม · ใบ กว. · ใบอนุญาต
- วันรับมอบงาน → วันครบระยะรับประกัน

👁 ใช้ตารางนี้อย่างไร

- คัดลอก Excel เป็น **Master Checklist** ของโครงการ
- เพิ่มคอลัมน์ “วันครบกำหนด” + “สถานะ” + “ลิงก์ไฟล์”
- ตัดแถวที่สัญญาไม่กำหนดออก · เพิ่มเอกสารเฉพาะโครงการ
- ทบทวนทุกวันศุกร์กับ PM

📌 สรุปติดต่อโครงการ (พิมพ์แล้วกรอกเอง)

บทบาท	ชื่อ	ตำแหน่ง	โทร	อีเมล
ผู้ว่าจ้าง (ผู้มีอำนาจลงนาม)				
ผู้ควบคุมงาน / CM				
ประธานกรรมการตรวจรับ				
ผู้ออกแบบ (สถาปนิก/วิศวกร)				
PM / ผู้บริหารฝ่ายเรา				
บัญชี / การเงิน ฝ่ายเรา				
ธนาคาร (LG) · บริษัทประกันภัย				
ห้องแล็บทดสอบ				



สรุปท้ายเล่ม

10 ข้อที่ PE ใหม่ต้องจำ + คำศัพท์ที่เจอบ่อย

อ่านหน้านี้ก่อนเริ่มงานวันแรก แล้วกลับมาทบทวนทุกเดือน

1 2 3 4 5 6 7

ใช้ได้ทุก PHASE

1

ไม่มีหนังสือ = ไม่เกิดขึ้น

คำสั่ง ข้อตกลง การอนุมัติ ทุกอย่างต้องเป็นลายลักษณ์อักษร (หนังสือ / MOM / ลายเซ็นในเอกสาร)

3

ห้ามทำงานเพิ่ม/เปลี่ยนวัสดุ ก่อนได้อนุมัติ

ทำไปก่อน = อาจเบิกเงินไม่ได้ และอาจต้องรู้

5

ส่งทุกครั้งต้องมีหลักฐานรับ

ลายเซ็นผู้รับ + วัน/เวลา หรือตรารับ + เลขรับ แล้วสแกนเก็บ

7

หน้างานใช้แต่ Rev. ล่าสุดที่อนุมัติแล้ว

Rev.เก่าประทับ “ยกเลิก” และเก็บออกจากหน้างาน

9

เฝ้าวันหมดอายุ

LG · ประกันภัย · ใบ กว. · ใบอนุญาต → เตือนล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

2

อ่านสัญญาให้จบ ทำสรุป 1 หน้า

รู้วันสิ้นสุด งวดงาน ค่าปรับ หลักประกัน ระเบียบประกัน และที่อยู่ส่งหนังสือ

4

นับวันให้เป็น

วันปฏิทิน vs วันทำการ · กำหนดแจ้งเหตุขอขยายเวลา · ค่าปรับรายวัน · กำหนดตอบเอกสาร

6

ได้เอกสารมา จบในวันเดียว

ลงรับ → ตรวจสอบลายเซ็น/ตรา → สแกน → Register → เข้าแฟ้ม

8

ถ่ายรูปงานที่จะถูกปิดเสมอ

เหล็กเสริม ท่อฝัง ถังซึม ฐานราก → ปิดแล้วพิสูจน์ไม่ได้

10

ไม่แน่ใจ ถามก่อนเซ็น

ถาม PM/รุ่นพี่ก่อนลงนามใด ๆ · ถามผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร (RFI)

คำศัพท์ที่เจอบ่อย

PE / PM	วิศวกรโครงการ / ผู้จัดการโครงการ
CM	ที่ปรึกษาควบคุมงาน (Construction Manager)
QS · DC	ผู้ถอดปริมาณ/ประมาณราคา · ผู้ควบคุมเอกสาร
TOR	ขอบเขตของงาน (Terms of Reference)
BOQ	บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา
LOA · ใบสั่งจ้าง	หนังสือแจ้งการยอมรับข้อเสนอลงจ้าง / สั่งจ้าง
NTP	หนังสือแจ้งให้เริ่มงาน (Notice to Proceed)
LG · Bond	หนังสือค้ำประกันของธนาคาร
e-LG	หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์
CAR	ประกันภัยงานก่อสร้าง (Contractor's All Risks)
Submittal	เอกสารที่ส่งขออนุมัติ
Shop Drawing	แบบขยายเพื่อการก่อสร้างจริง
Method Statement	เอกสารแสดงขั้นตอน/วิธีการทำงาน
RFI	หนังสือขอคำชี้แจง (Request for Information)
Transmittal	ใบนำส่งเอกสาร
Register	ทะเบียนคุมเอกสาร (Excel)
Controlled Copy	เอกสารฉบับควบคุมที่ใช้หน้างาน

Superseded	ถูกแทนที่ด้วย Rev. ใหม่แล้ว ห้ามใช้
MOM	รายงานการประชุม (Minutes of Meeting)
S-Curve	กราฟความก้าวหน้าสะสม แผน vs จริง
Look-ahead	แผนงานล่วงหน้า 2-3 สัปดาห์
VO	งานเพิ่ม-ลด / คำสั่งเปลี่ยนแปลงงาน
EOT	การขยายเวลาก่อสร้าง
Retention	เงินประกันผลงานที่หักไว้ในแต่ละงวด
T&C	ทดสอบและเดินระบบ (Testing & Commissioning)
Punch / Defect List	รายการที่ต้องแก้ไขก่อนส่งมอบ
As-built	แบบก่อสร้างจริง
O&M Manual	คู่มือใช้งานและบำรุงรักษา
DLP	ระเบียบประกันความซื่อสัตย์สุจริต
กว.	ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
จป.	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
e-GP	ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
50 นว	หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ก.พ.20	ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

🕒 ก่อนกลับบ้าน (ทุกวัน)

- ☐ Daily Report ส่ง CM แล้ว
- ☐ รวบรวมไฟล์ Folder ตามวันที่
- ☐ เอกสารเข้าวันนี้ ลงรับ-สแกน-Register ครบ
- ☐ พรุ่งนี้มีงานต้องขอตรวจ? ยื่นใบขอตรวจงานแล้ว
- ☐ มีคำสั่งด้วยวาจา? ทำหนังสือยืนยันแล้ว

📅 ทุกวันศุกร์

- ☐ Register: รายการเลยกำหนด → กว
- ☐ Submittal ที่ต้องได้อนุมัติใน 2-4 สัปดาห์หน้า
- ☐ ความก้าวหน้า vs แผน (Look-ahead)
- ☐ MOM ที่ยังไม่ได้ลงนาม
- ☐ Backup ไฟล์ทั้งหมด

📅 ทุกสิ้นเดือน

- ☐ Monthly Report + อัปเดต S-Curve
- ☐ งวดงานถัดไป: ยังขาดงาน/เอกสารอะไร
- ☐ ติดตามเงินงวดที่ยังไม่ได้รับ
- ☐ วันหมดอายุเอกสารภายใน 30-60 วัน
- ☐ ทบทวน Master Checklist (หน้า 12-13)
